



*Consorzio per l' Area di Sviluppo Industriale
della Provincia di Trapani in liquidazione
Gestione Separata IRSAP*

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 35 / TP
del 16/12/2014

OGGETTO: Realizzazione di uno stabilimento industriale da parte della ditta I.M.C. S.p.A.,
sull'area costituita dal lotto 38/B – Concessione proroga per ultimazione dei lavori.

Il Dirigente Responsabile

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati emanati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 8/ 2012 che recita “.....il Presidente dell'IRSAP, subentrato ai Commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto art.19, è il legale rappresentante,... dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica.....”;

RILEVATO che con il suddetto art.64 della L. R. n.9/2013 il Presidente nominato è subentrato nelle posizioni e nelle funzioni dei Commissari Liquidatori dei soppressi Consorzi ASI di Sicilia;

VISTO il D.P.R.S. n. 263/ Serv.1°/ SG del 18.09.2013, con il quale è stato nominato il Presidente dell'IRSAP;

VISTO il D.P.R.S. n. 2 dell'11.01.2013, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRSAP;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP approvato con Decreto n. 44/ Gab del 06/03/20013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 10/1991, da stipulare tra l' IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRSAP n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra l'IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

VISTO l' accordo sottoscritto in data 05/03/2013, tra l'IRSAF ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Trapani, Gestione Separata IRSAF, conforme allo schema di cui sopra;

VISTA la circolare interassessoriale n. 4 del 25 luglio 2013 degli Assessori Regionali delle Attività Produttive e dell'Assessore Regionale dell'Economia pubblicata nella GURS del 16 agosto 2013 parte 1° n.38;

VISTA, per quanto applicabile, la legge regionale n. 1 del 04/01/1984, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della sopracitata legge regionale n. 8 del 12/01/2012;

VISTA la nota IRSAF n. 166 dell'11.01.2013, con la quale il Direttore Generale, nel comunicare il proprio insediamento, invita i Dirigenti Coordinatori a sottoporre allo stesso, con formale proposta, tutti gli atti da approvare;

VISTA la nota IRSAF prot. n. 5586 del 22.07.2013 con la quale è stato nominato Dirigente Coordinatore dell' Ufficio Periferico di Trapani l' Ing. Piero Reina, già Dirigente dell' Area Tecnica;

VISTA, la nota IRSAF prot. n.6228 del 12.08.2013 con la quale, viene indicata la nuova denominazione da utilizzare per i Dirigenti preposti alla direzione degli uffici periferici, quale "Dirigente Responsabile Ufficio Periferico di Trapani";

PREMESSO CHE:

- In data 15 ottobre 2010 ai rogiti del notaio Ugo Barresi, il Consorzio ha trasferito alla ditta "Sicilmangimi s.r.l" un lotto di terreno, identificato con il numero 38/B, esteso mq. 8.068, ai fini della realizzazione di un capannone industriale destinato alla produzione di contenitori per uova;
- Con determinazione n. 22 del 18 luglio 2012 il Commissario Straordinario Liquidatore ha autorizzato la ditta "Sicilmangimi s.r.l. a trasferire il lotto n. 38/B a seguito di cessione di un ramo d'azienda alla ditta "I.M.C. S.p.A." ed con atto in data 10 settembre 2012 ai rogiti del notaio Gino Attilio Di Vita, numero 39224 di repertorio e 20707 della raccolta è stata sottoscritta la cessione;
- Con nota del 24 settembre 2014 la "I.M.C. S.p.A. " ha richiesto una proroga per l'ultimazioni dei lavori;
- Il sopracitati atti di stabiliscono che *" I lavori di realizzazione dello stabilimento industriale dovranno avere inizio entro trenta giorni dal rilascio della concessione edilizia, relativa al progetto, e dovranno essere portati a termine entro trentasei mesi dalla data odierna, salvo eventuale proroga richiesta dalla società e concessa dal Consorzio, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 1984 numero 1"*;
- **Accertato** che il termine di fine lavori per la realizzazione dello stabilimento di che trattasi era previsto, per il quattordici (14) aprile 2013;
- **Dato** che l'articolo numero 23 comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1984 numero 1 dispone che gli atti di vendita dei terreni devono prevedere termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori per la realizzazione dello stabilimento e tali termini potranno essere prorogati una sola volta e per non più di diciotto (18) mesi con atto motivato, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati;
- **Visto** il verbale di sopralluogo del 14 ottobre 2014 redatto dagli uffici consortili dal quale si evince che i lavori di realizzazione dello stabilimento sono concretamente iniziati;
- **Visto** il cronoprogramma dei lavori, presentato dalla ditta dal quale risulta che i lavori di realizzazione dello stabilimento saranno portati a termine entro il mese di marzo 2015;
- **Preso** atto del cronoprogramma presentato dalla ditta e ritenuto di concedere la proroga una proroga di diciotto mesi decorrenti dal 14 ottobre 2013 per il completamento dello stabilimento industriale da realizzare sull'area costituita dal lotto numero 38/B, sito all'interno dell'agglomerato est dell'A.S.I. di Trapani;

- Vista la comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 84 comma 2 del D. Lgl n. 159/2001 in data 03/11/2014 (prot. 54423) con la quale la Prefettura di Trapani ha attestato che nei confronti della società "I.M.C. S.p.A." e delle persone sottoposte a verifica *"non sussistono agli atti d'ufficio cause di divieto sospensione o decadenza previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159"*;
- Vista la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Periferico in data 12/11/2014;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- Di concedere alla ditta "I.M.C. S.p.A." con sede in Trapani nella via Girolamo Fardella lotti 26/C e 27/B (c.f. 01855490817) una proroga di diciotto mesi decorrente dal 14 ottobre 2013 per il completamento dello stabilimento industriale destinato alla fabbricazione e lavorazione di prodotti e semilavorati in metallo.
- Di stabilire che il mancato rispetto del cronoprogramma presentato dalla ditta, che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, comporterà l'attivazione delle procedure necessarie alla revoca dell'area costituita dal lotto n. 38/B.
- Di stabilire che restano ferme tutte le condizioni e i vincoli scaturenti dagli atti stipulati in data 15 ottobre 2010, ai rogiti notarili del notaio Ugo Barresi, numero 62.127 del repertorio e numero 13.491 della raccolta, ed in data 10 settembre 2012 ai rogiti del notaio Gino Attilio Di Vita, numero 39224 di repertorio e 20707 della raccolta, cui la ditta "I.M.C. S.p.A." è obbligata a rispettare.

Ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 10/1991, si attesta che nella formazione della proposta di cui all'oggetto, sono state valutate le condizioni di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



Il Dirigente Responsabile
Dr. Ing. Piero Reina

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in liquidazione, gestione separata IRSAP di Catania, si esprime parere tecnico favorevole all'adozione della predetta.

Il Dirigente Area Tecnica
(Ing. Daniele Tricomi)

IL DIRIGENTE DELEGATO

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in liquidazione, gestione separata IRSAP di Catania;
- Tenuto conto che con DDG n. 21 del 04/02/2014 il Direttore Generale dell'IRSAP ha delegato alla dott.ssa Anna Di Martino le proprie funzioni in caso di assenza o impedimento;
- Visti i pareri annotati al n. 13703 del 07/11/2014 e n. 13739 del 10/11/2014 formulati dal prof. avv. Massimiliano Marinelli il quale, in risposta a richieste avanzate dall'Istituto con note n. 13701 del 07/11/2014 e n. 13725 del 10/11/2014, si è espresso ritenendo che *"la delega in questione è correttamente rivolta ad assicurare la funzionalità dell'Ente, garantendo che, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, non si realizzi una paralisi dell'azione amministrativa, con le intuibili conseguenze sul corretto espletarsi della funzionalità dell'Istituto."* ed ancora *"... l'attribuzione delle funzioni produce i suoi effetti fino a quando il Direttore Generale (indipendentemente dalla persona fisica che ricopra l'incarico) non procederà alla revoca o alla modifica di essa."*;
- Vista la nota assessoriale n. 62160/DIR del 10/11/2014, annotata al prot. n. 13740, con la quale si prende atto della DDG n. 21/2014 relativa alla delega delle funzioni del Direttore Generale alla dott.ssa Anna Di Martino;
- Vista la nota IRSAP n. 13741 dell' 11/11/2014 con la quale è stato comunicato all'Assessorato Regionale Attività Produttive che gli atti gestionali dell'IRSAP e delle singole Gestioni Separate aventi carattere di indifferibilità ed urgenza saranno sottoscritti dalla Dott.ssa Anna Di Martino, Dirigente delegata alle funzioni di cui alla DDG n. 21 del 04/02/2014;
- Rilevato che a tutela dell'interesse pubblico rappresentato appare necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, al fine di evitare la possibile insorgenza di nocumento e/o danno e responsabilità;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area Tecnica;
- Visto l'atto di indirizzo impartito dal Presidente con nota prot. 14936 del 04/12/2014, ribadito con nota prot. 15357 del 15/12/2014;
- Ritenuto che la presente proposta riveste carattere di indifferibilità ed urgenza;

DETERMINA

- **Di** concedere alla ditta " I.M.C. S.p.A." con sede in Trapani nella via Girolamo Fardella lotti 26/C e 27/B (c.f. 01855490817) una proroga di diciotto mesi decorrente dal 14 ottobre 2013 per il completamento dello stabilimento industriale destinato alla fabbricazione e lavorazione di prodotti e semilavorati in metallo.
- **Di** stabilire che il mancato rispetto del cronoprogramma presentato dalla ditta, che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, comporterà l'attivazione delle procedure necessarie alla revoca dell'area costituita dal lotto n. 38/B.
- **Di** stabilire che restano ferme tutte le condizioni e i vincoli scaturenti dagli atti stipulati in data 15 ottobre 2010, ai rogiti notarili del notaio Ugo Barresi, numero 62.127 del repertorio e numero

13.491 della raccolta, ed in data 10 settembre 2012 ai rogiti del notaio Gino Attilio Di Vita, numero 39224 di repertorio e 20707 della raccolta, cui la ditta "I.M.C. S.p.A." è obbligata a rispettare

Il Dirigente Delegato
alle Funzioni di cui alla DDG n. 21 del 04/02/2014
Dott. ssa Anna Di Martino

16.12.14




Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. n. _____ del _____

Al Dirigente Responsabile
= S E D E =

OGGETTO: I.M.C. S.p.A. - Richiesta concessione proroga ultimazione dei lavori - Sopralluogo
lotto industriale n. 38/B.

In data 14 ottobre 2014 alle ore 11,05 i sottoscritti Scarcella Francesco e Pace Rosario entrambi avente la qualifica di Istruttore Direttivo, hanno effettuato un sopralluogo nel lotto n. 38/B sito all'interno dell'Agglomerato Est dell'A.S.I. di Trapani, di proprietà della ditta I.M.C. S.p.A. accertando quanto segue:

Sull'area risulta realizzata una struttura provvista di pareti perimetrali e copertura realizzati con pannelli coibentati metallici.

L'area risulta provvista di recinzione, realizzata con muretto in calcestruzzo e completata con tubolari metallici e/o rete metallica fatta accezione del lato nord-est confinante con i lotti 26/B e 27/C di proprietà della stessa ditta I.M.C. S.p.A.

Le aree circostanti la struttura sopraccitata risultano in fase di realizzazione.

Il sopralluogo ha accertato un concreto inizio dei lavori di realizzazione dello stabilimento nel lotto industriale n. 38/B.

L'Istruttore Direttivo
(Scarcella Francesco)

L'Istruttore Direttivo
(Pace Rosario)


Si allegano rilevazioni fotografiche.

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814


Tel. 09233296111
Fax. 09233296299
Mail: trapani@irsapsicilia.it
Pec: trapani@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA




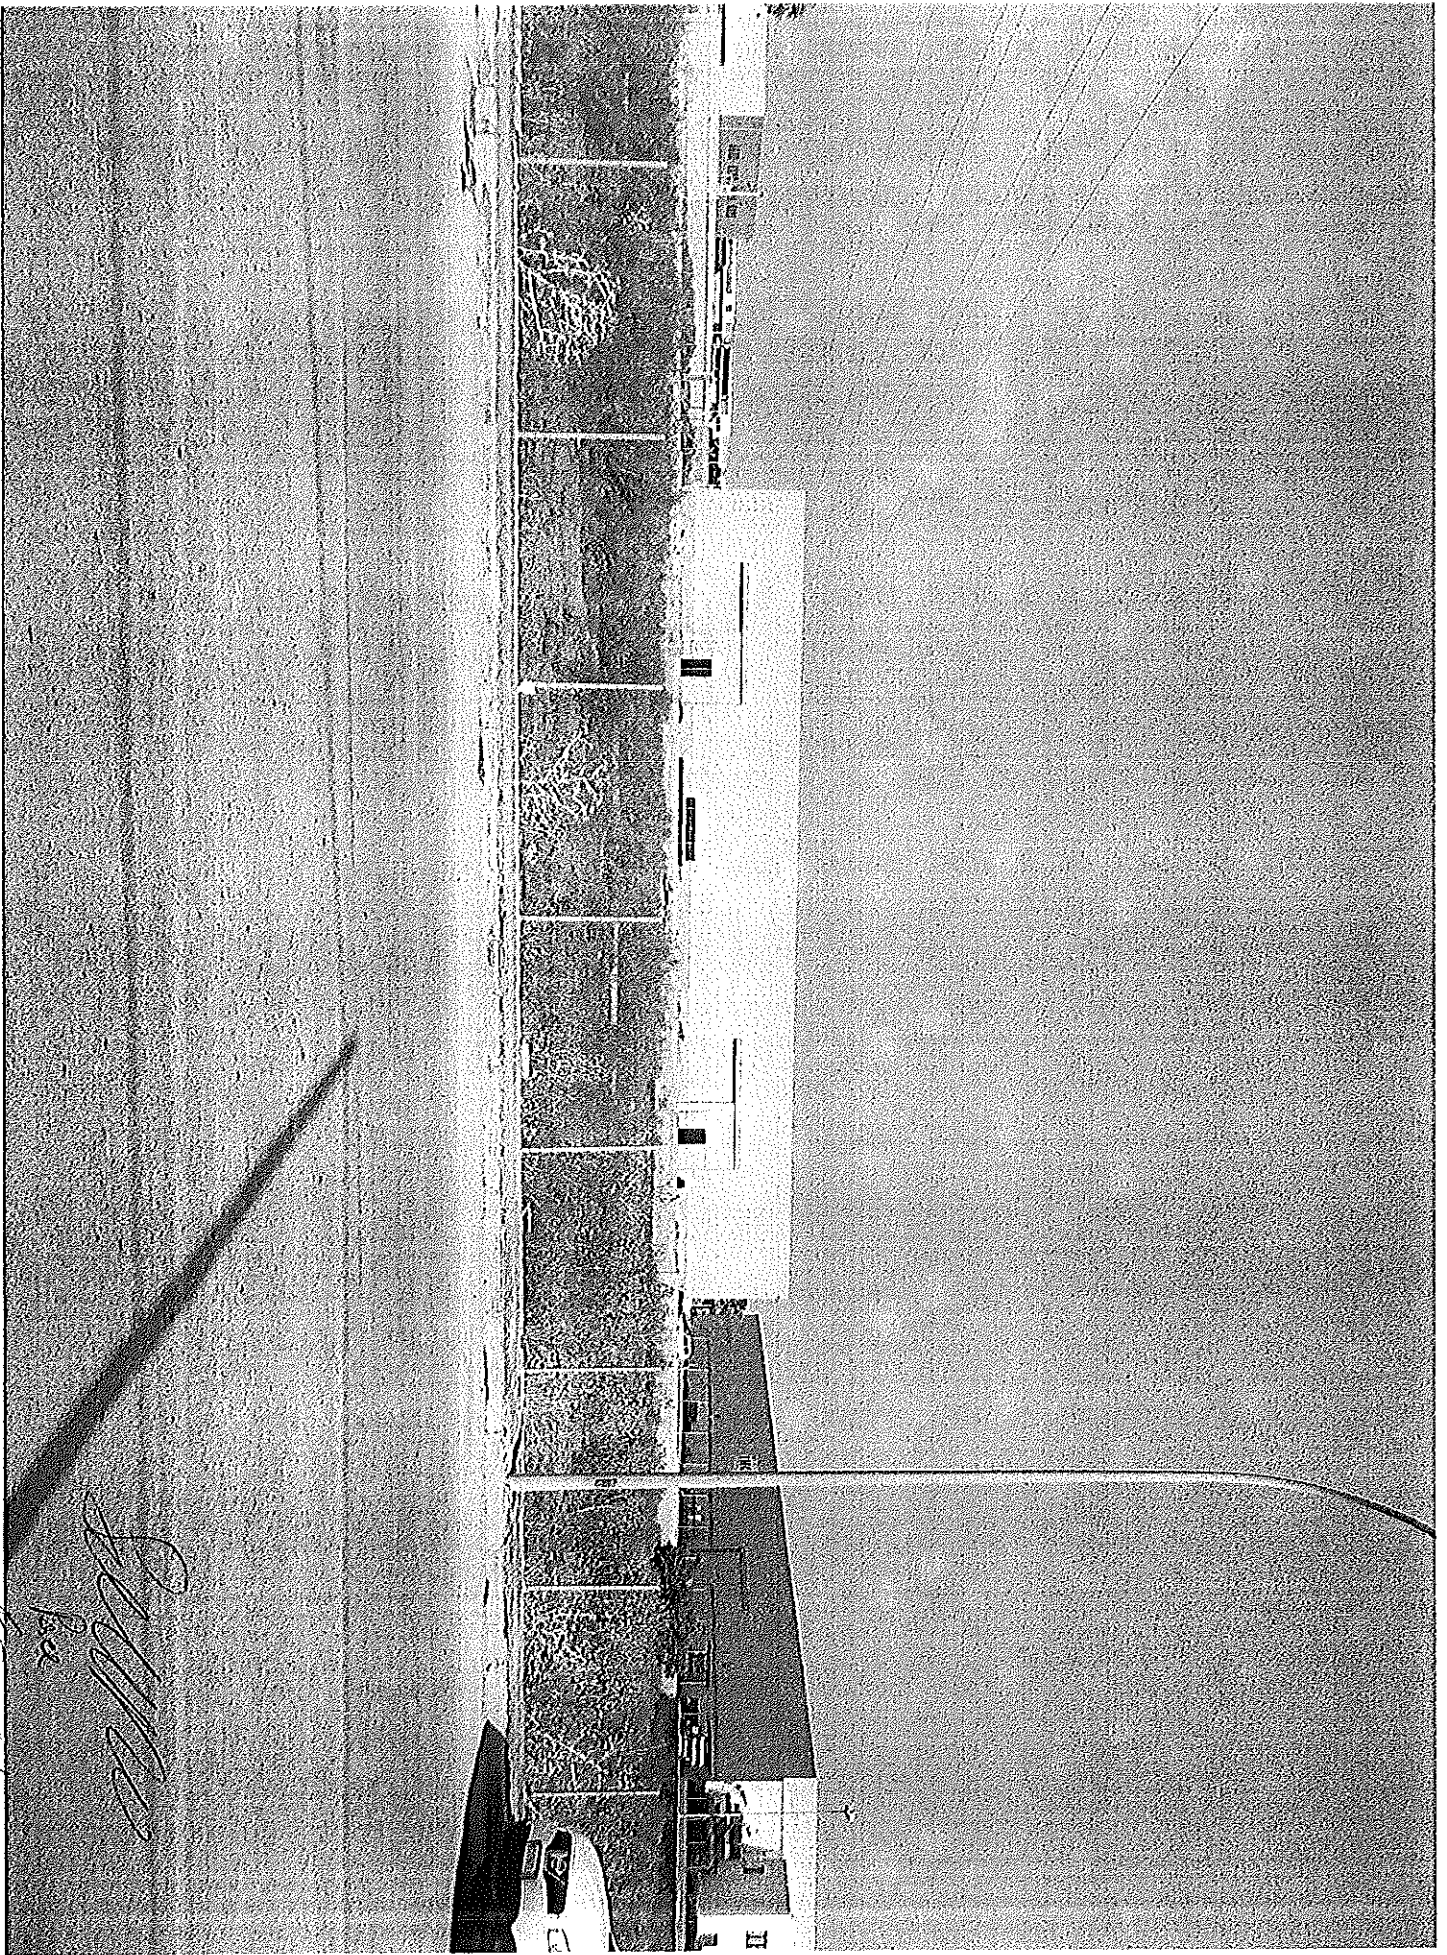


1510 W 1st
Box
Mesa

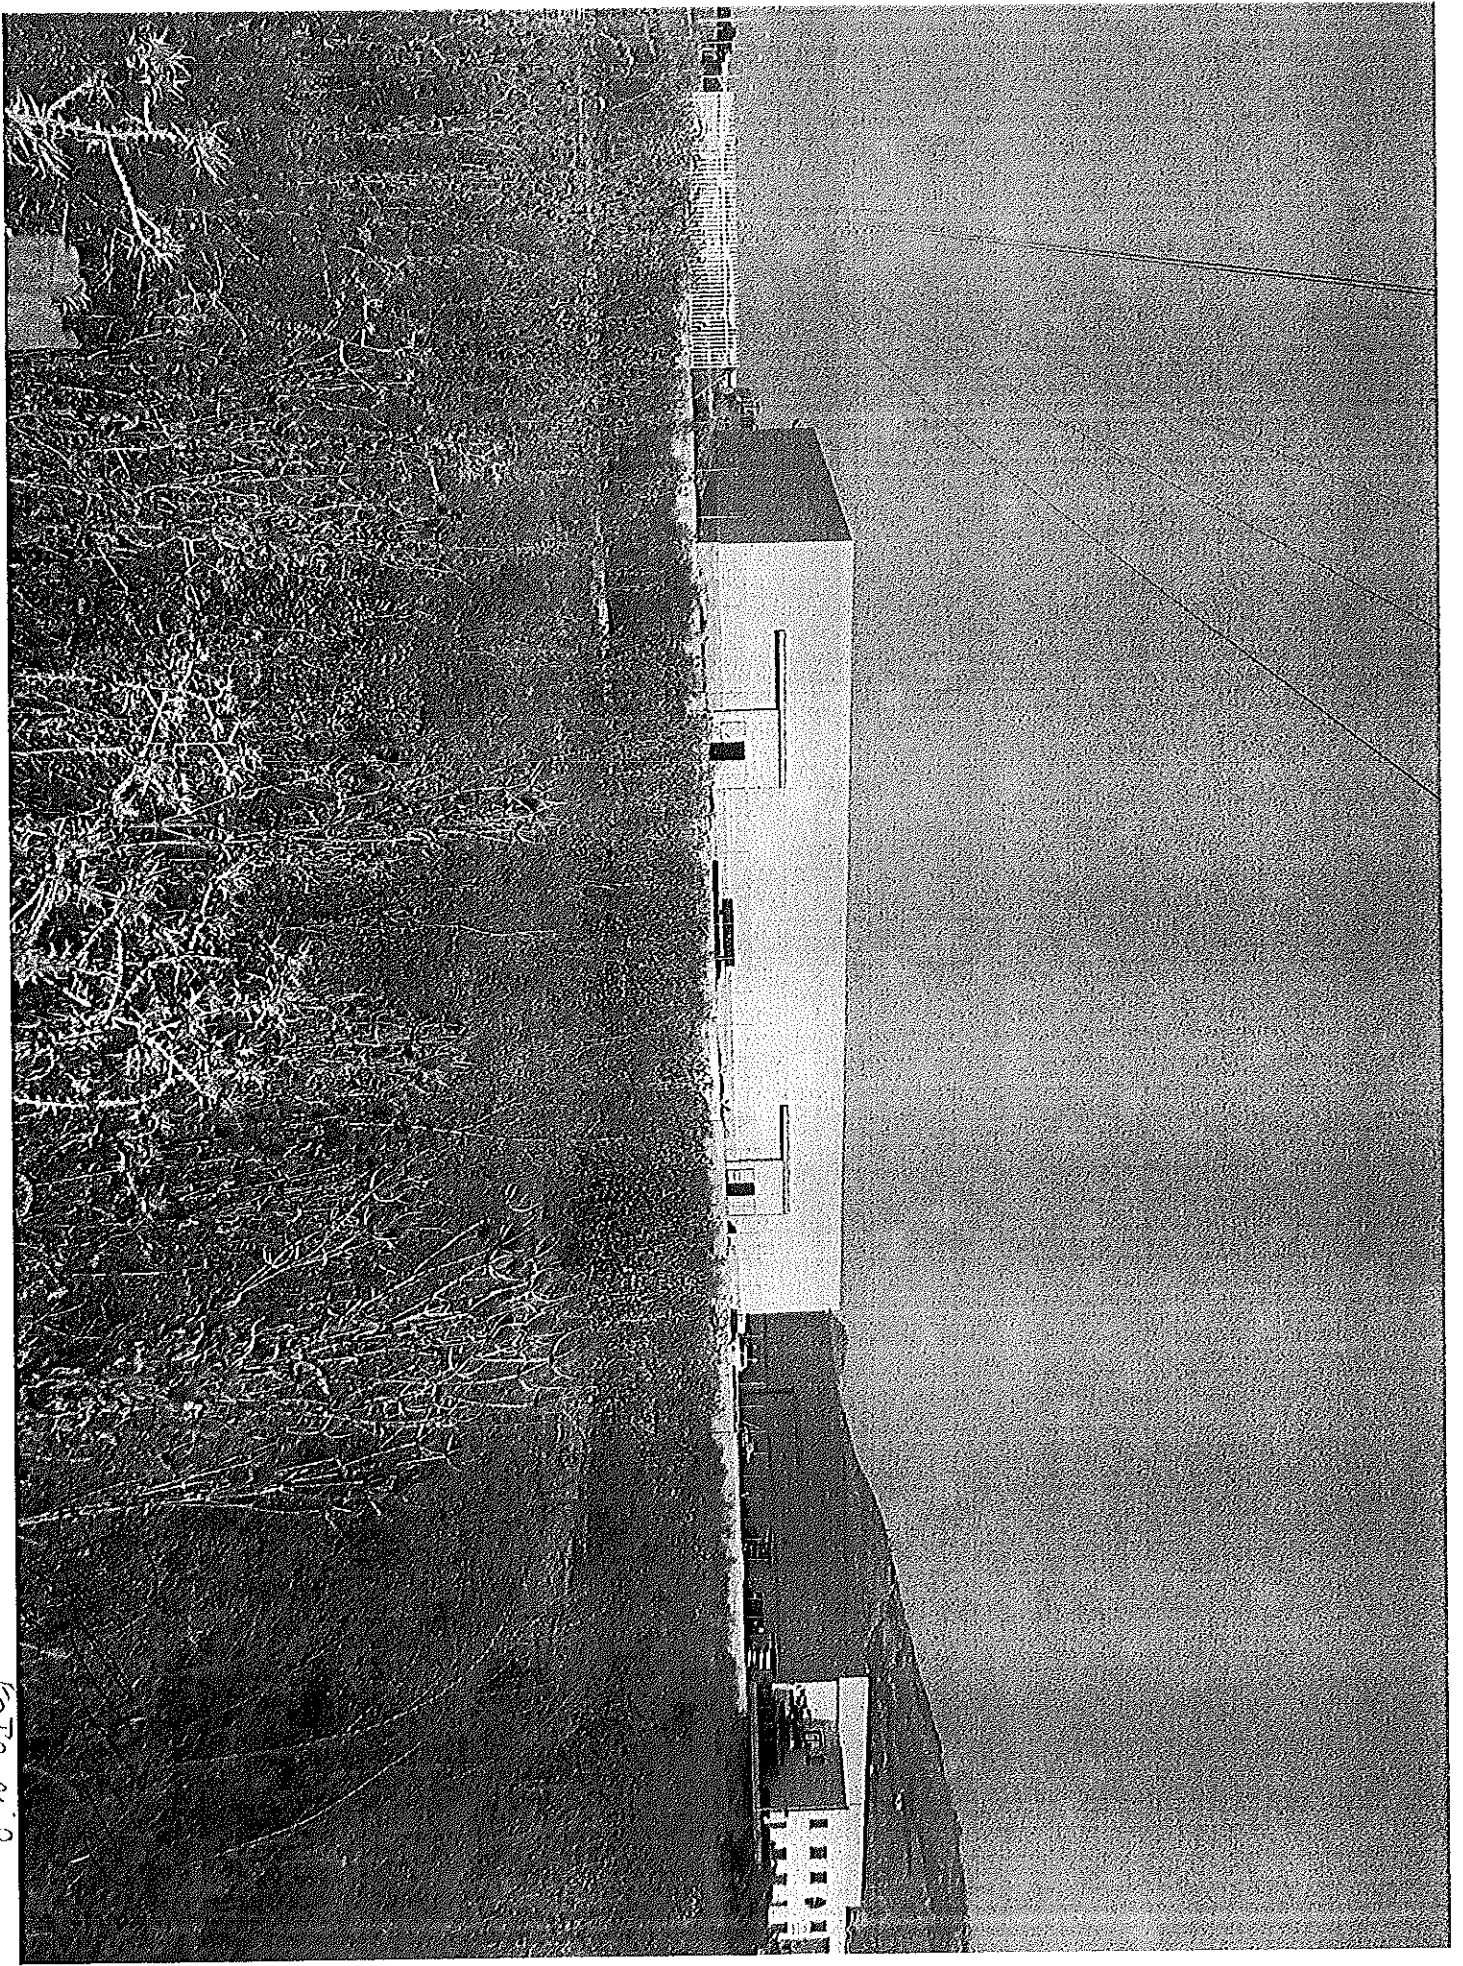


1070 277

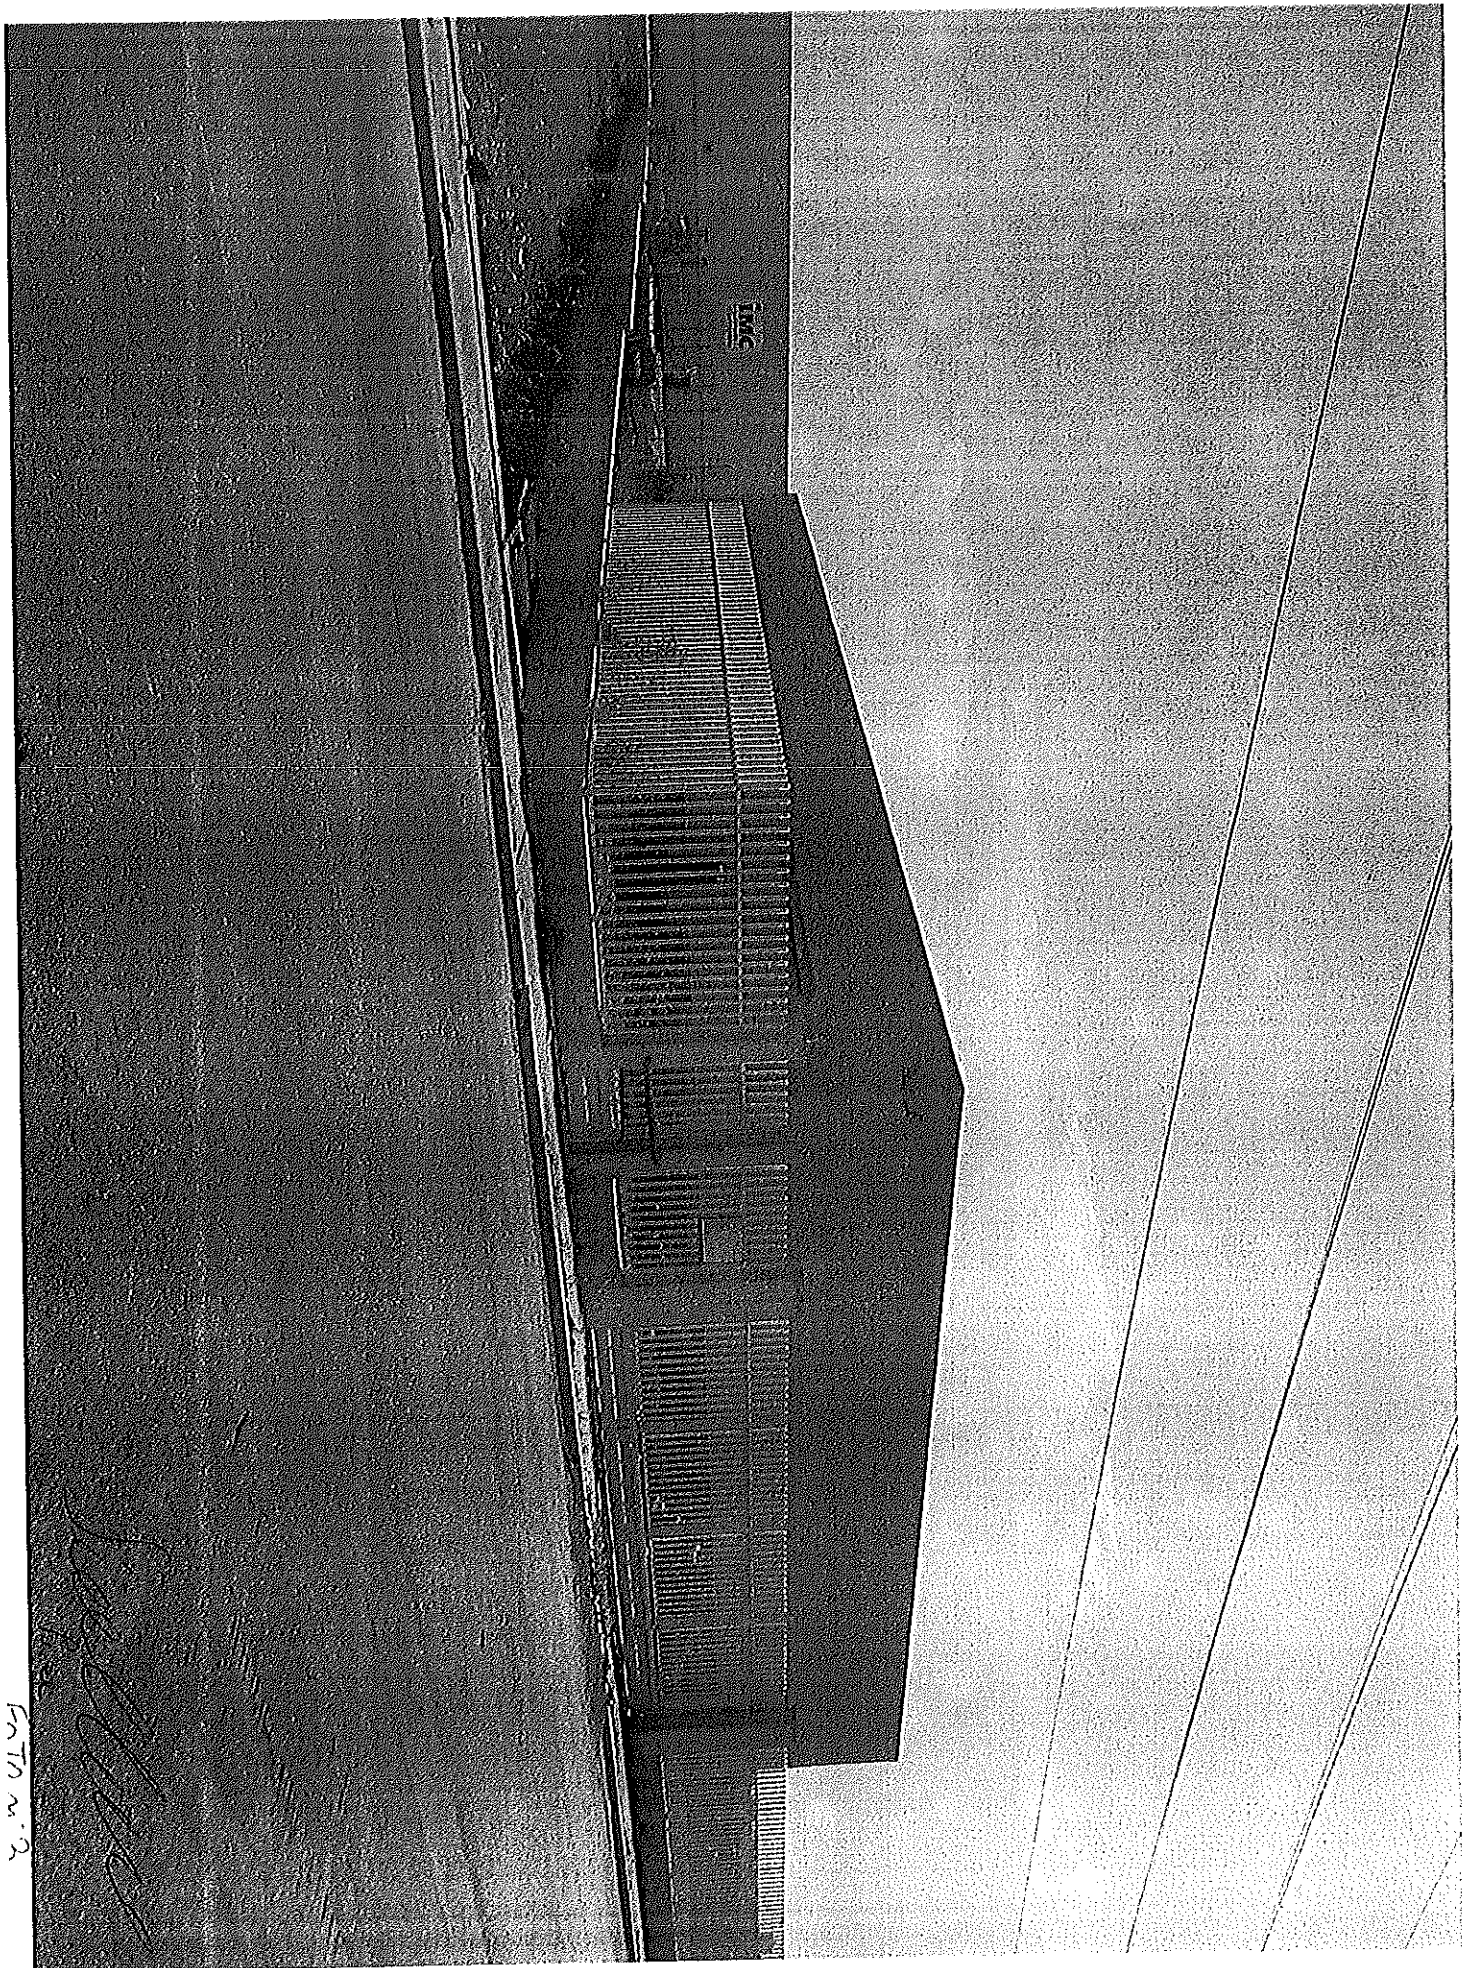

2. 2. 01. 2

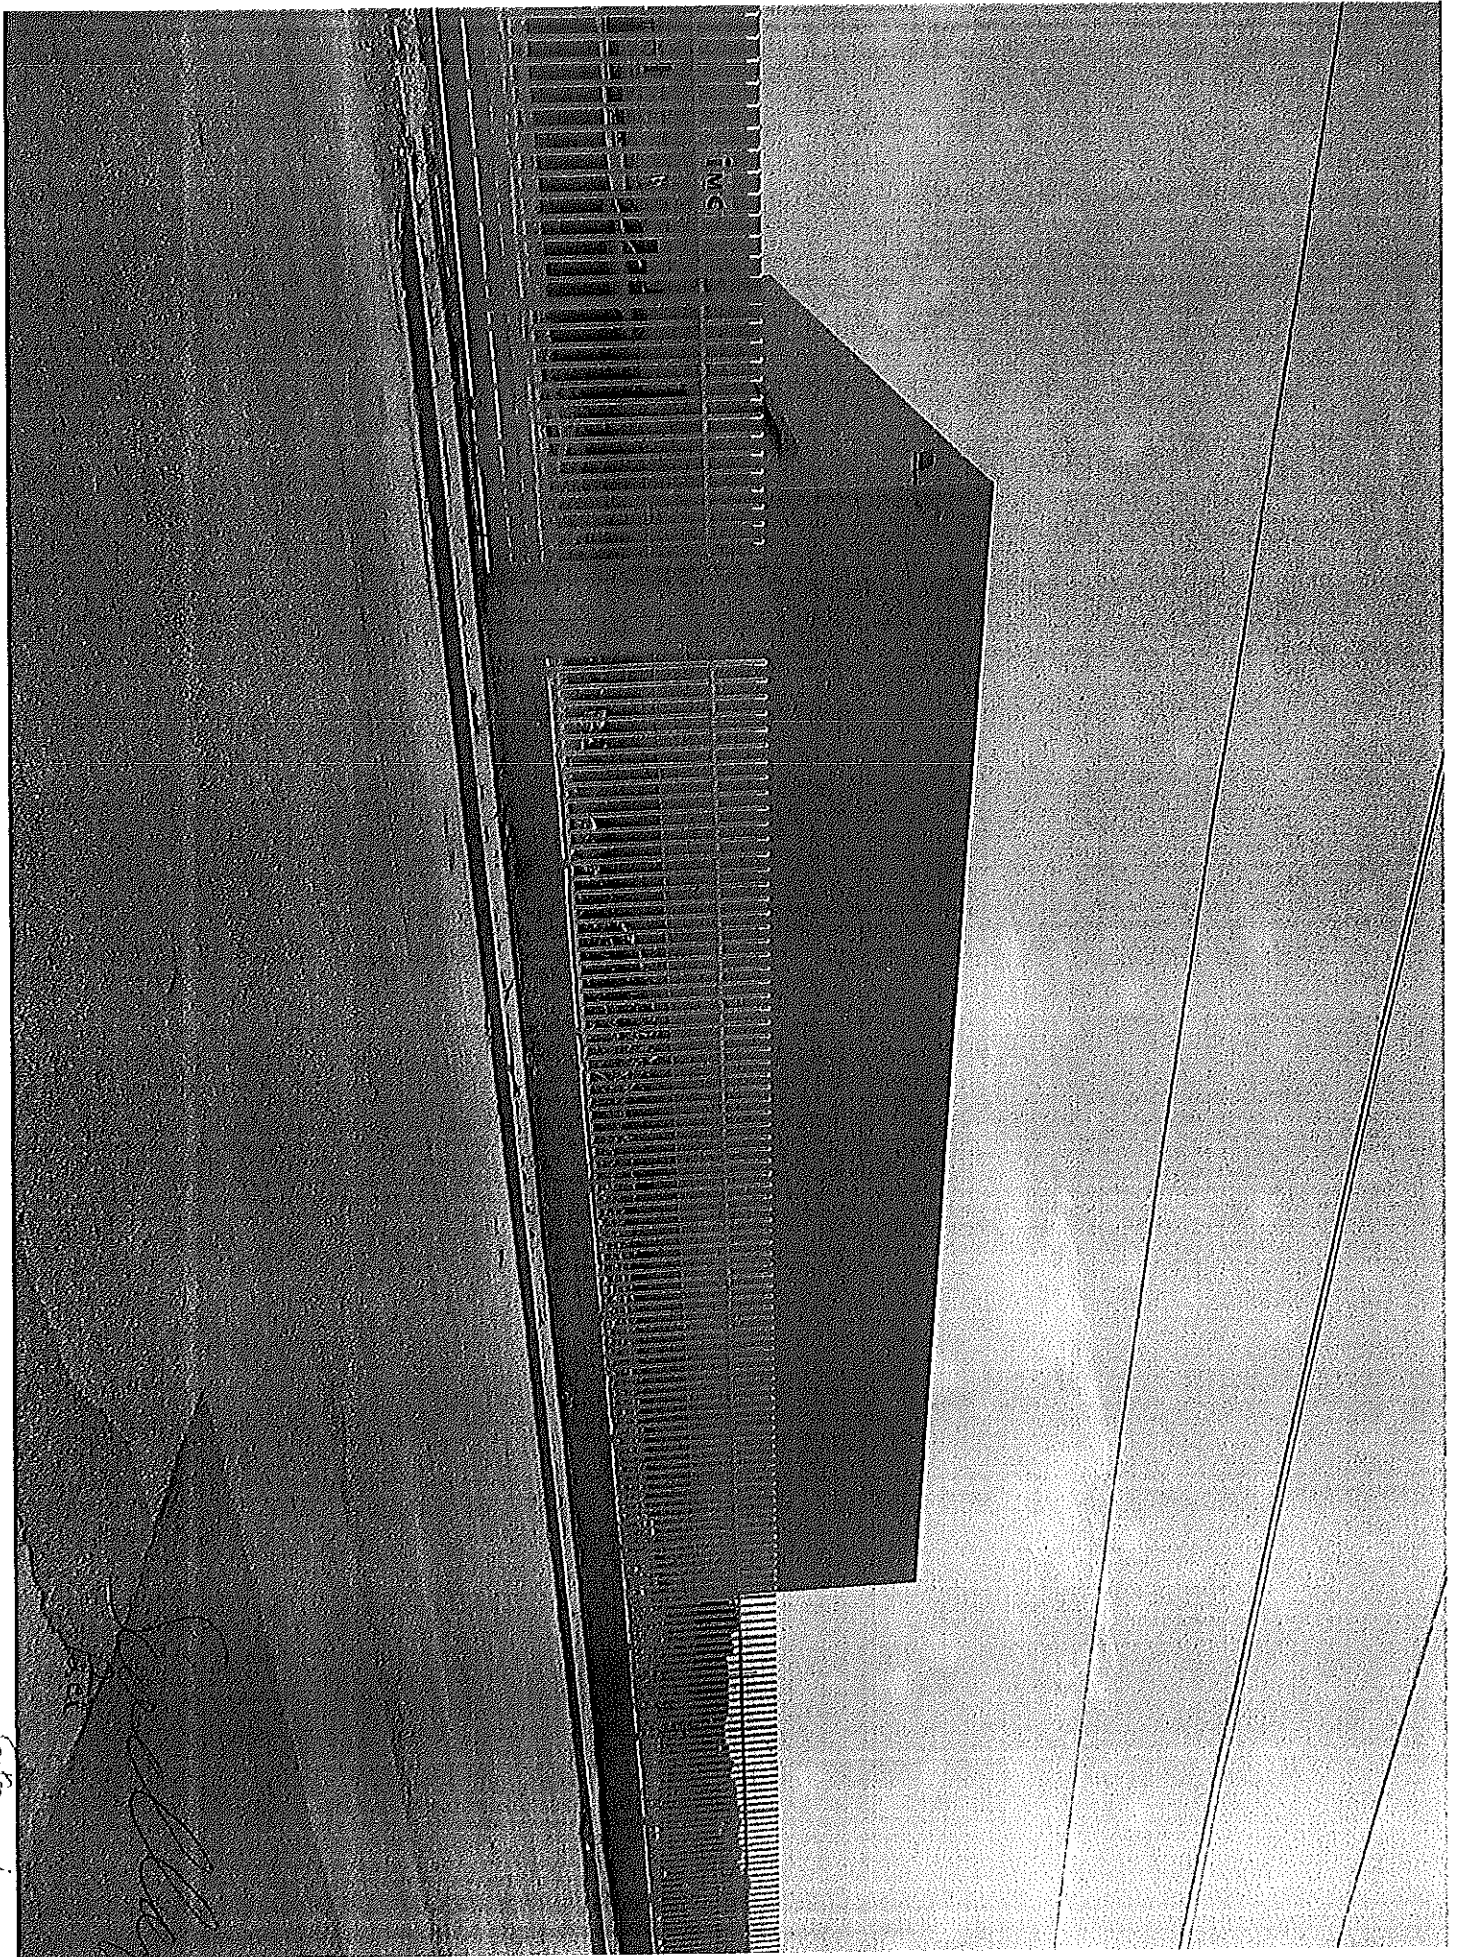

London - 11

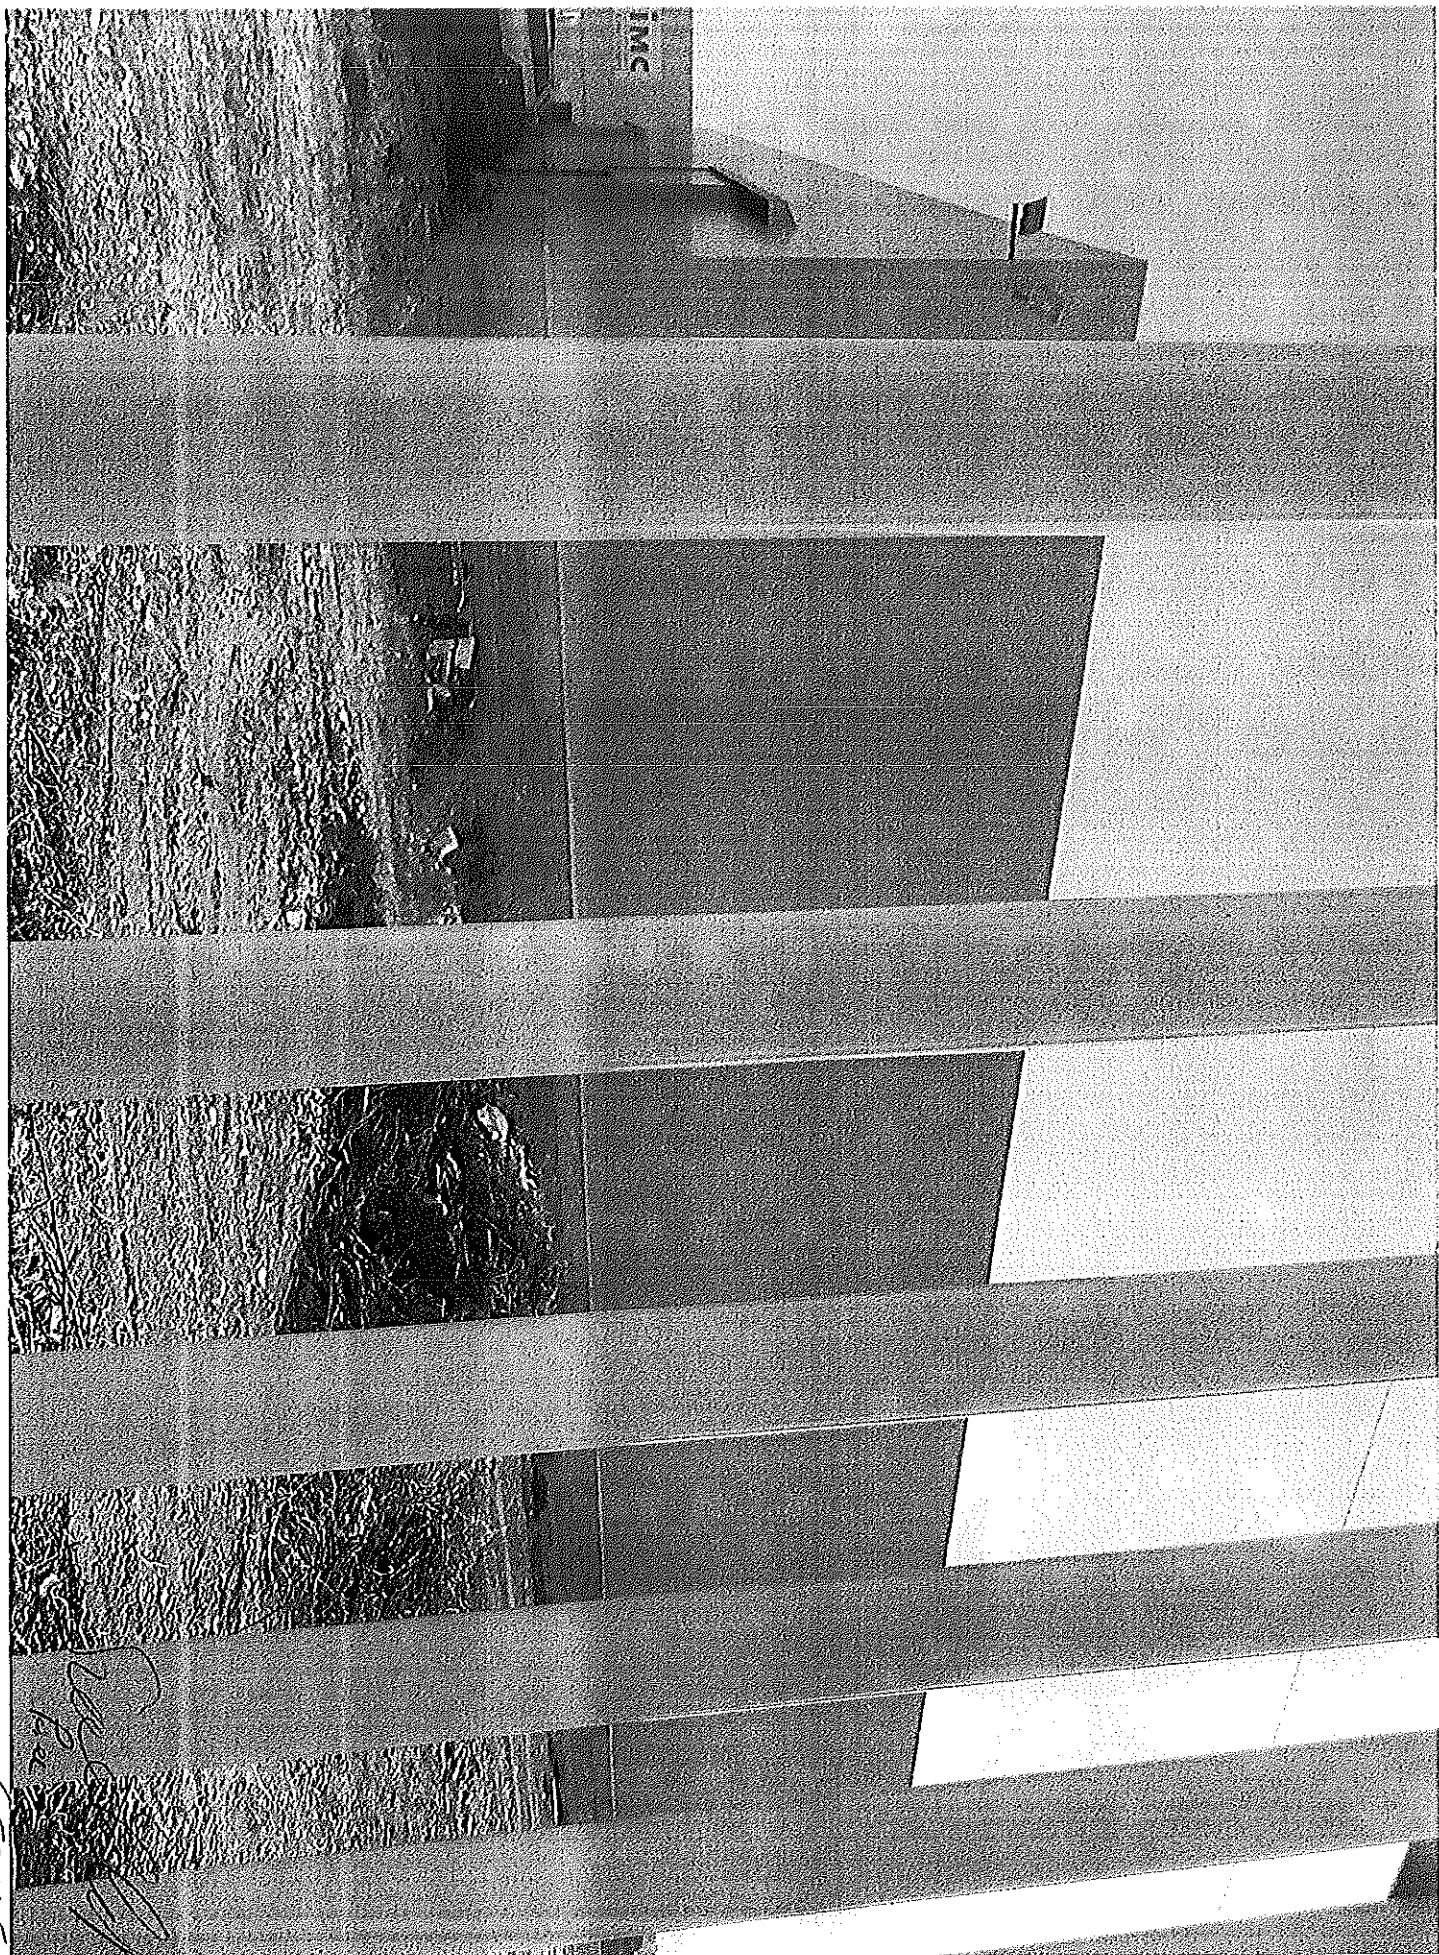

INC

ASTON 5

2/25/00
for
M

**OGGETTO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNO
STABILIMENTO INDUSTRIALE ALL'INTERNO DELL'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI TRAPANI, LOTTO n. 38/B.**

DITTA: I.M.C. – INDUSTRIE METALLI CARDINALE S.P.A.

Zona Industriale A.S.I. – via G. Fardella lotti 26/C e 27/B - Trapani.

Il presente cronoprogramma viene redatto, relativamente ai lavori di realizzazione dell'opificio industriale meglio specificato in oggetto all'interno del lotto n. 38/B dell'Area di Sviluppo Industriale di Trapani, in modo da poter prevedere in modo attendibile il tempo necessario al completamento dell'opera i cui lavori sono iniziati in data 03/02/2010 a seguito del rilascio, da parte del S.U.A.P. di Trapani, del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 41 del 26/11/2010 e continuati dalla ditta I.M.C. – INDUSTRIE METALLI CARDINALE S. p. A., nuova proprietaria del lotto, venuta in possesso del lotto in oggetto in seguito all'Atto di Cessione Ramo di Azienda rogato dal notaio dott. Gino Attilio Di Vita in data 10/09/2012 dopo la necessaria Autorizzazione del Consorzio A.S.I. con Determinazione del Commissario Straordinario Liquidatore n. 22 del 18/07/2012.

A seguito della cessione sopra menzionata, inoltre, il SUAP di Trapani, con nota n. 18937 del 13/02/2013 ha preso atto del cambio di proprietà onerando la I.M.C. al rispetto dei termini e delle condizioni menzionate nel P.U. 41/2010.

Allo stato, risulta realizzato l'intero capannone, completo di fondazione, struttura in metallo, coperture, compagne, infissi e pavimentazione industriale; è stata, inoltre, realizzata la zona servizi interna ad esso e completata la recinzione del lotto, ad eccezione del previsto rivestimento in pietra locale a vista.

E' stata, altresì, iniziata e parzialmente realizzata la viabilità interna al lotto.



Il tutto, con parziali modifiche al progetto originario per le quali è già stato presentato regolare progetto di sanatoria al SUAP di Trapani ai sensi dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.

L'importo complessivo del realizzato, comprese spese di acquisto terreno, risulta essere di € 1.000.000 circa.

Riguardo ai lavori ancora da realizzarsi per il completamento di quanto previsto e compatibilmente con il rilascio del provvedimento unico in sanatoria essi potrebbero essere completati secondo il seguente cronoprogramma:

Dicembre 2014	Realizzazione impianti e completamento recinzione	€ 100.000
Febbraio 2015	Realizzazione viabilità interna, parcheggi, piazzali e alberatura	€ 210.000
Marzo 2015	Collaudi Statico e Amministrativo / Agibilità	€ 20.000
	TOTALE	€ 330.000

Considerato che l'investimento previsto per il completamento dell'opera era di € 2.616.185 e che quello per le opere murarie (lotto + fabbricati) è di € 1.330.000 (1.000.000 + 330.000), la somma residua per dare l'immobile a completo e funzionante in ogni sua parte (acquisto macchinari, attrezzature ed arredi vari) risulta essere di € 1.286.185 (euro unmilione duecentottantaseimilacentottantacinque);

Trapani, lì

La Ditta

Carlo Maria Simeone

IMC...
R. Presidente del C.A.A.

Il Tecnico

Enrico Reina



Consorzio A.S.I. in liquidazione
Gestione dei rifiuti IRSA di Trapani

SEZ. CAR. POS.
N. 1038
DATA 07 NOV. 2014

PREFETTURA DI TRAPANI
Ufficio Territoriale del Governo

PROT. n. 3841 del 20 OTT. 2014

27 OTT. 2014

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
TRAPANI

Indirizzo P.E.C.: protocollo.proftp@pec.interno.it

POSTA IN ARRIVO

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE:

IRSAP - Ufficio periferico di Trapani

trapani@pec.irsapsicilia.it

OGGETTO: Richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 per:

- 1) SOCIETA' (DENOMINAZIONE) O PERSONA
FISICA:
(indicare anche il codice fiscale e la partita I.V.A.)

I.M.C. S.p.A.
Via G. Fardella Zona Industriale
91100 Trapani

Codice fiscale 01855490817

2)

LICENZE

~~AUTORIZZAZIONI~~

ABILITAZIONI

ISCRIZIONI

CONTRATTO OPERE E LAVORI
PUBBLICI

CONTRATTO PER SERVIZI O
PUBBLICHE FORNITURE

(barrare la casella che interessa)

3) Valore del contratto:

€

(gli importi si intendono al netto dell'I.V.A.).

Trapani,



FIRMA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Ing. Piero Reina



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani*

Prot.n 54423 /Area 1/Antimafia

li, 03/11/2014

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 84 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 6/9/2011 N. 159

Si attesta che nei confronti della Società indicata nella presente richiesta e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 85 della suddetta normativa, non sussistono, agli atti d'Ufficio, cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159.

Il Dirigente dell'Area I^A
Viceprefetto
(D. Lisi)

[Handwritten signature]

Il Prefetto della Provincia di





Ufficio periferico di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. N. _____ del _____

Al Dirigente Responsabile
= S E D E =

Oggetto: Realizzazione di uno stabilimento industriale da parte della ditta I.M.C. S.p.A., sull'area costituita dal lotto 38/B- Concessione proroga di ultimazione lavori.

Si premette quanto segue:

- In data 15 ottobre 2010 ai rogiti del notaio Ugo Barresi, il Consorzio ha trasferito alla ditta "Sicilmangimi s.r.l." un lotto di terreno, identificato con il numero 38/B, esteso mq. 8.068, ai fini della realizzazione di un capannone industriale destinato alla produzione di contenitori per uova;
- Con determinazione n. 22 del 18 luglio 2012 il Commissario Straordinario Liquidatore ha autorizzato la ditta "Sicilmangimi s.r.l." a trasferire il lotto n. 38/B a seguito di cessione di un ramo d'azienda alla ditta "I.M.C. S.p.A." e con atto in data 10 settembre 2012 ai rogiti del notaio Gino Attilio Di Vita, numero 39224 di repertorio e 20707 della raccolta è stato sottoscritto l'atto di cessione;
- Con nota del 24 settembre 2014 la "I.M.C. S.p.A." ha richiesto una proroga per l'ultimazioni dei lavori;
- I sopraccitati atti di stabiliscono che "I lavori di realizzazione dello stabilimento industriale dovranno avere inizio entro trenta giorni dal rilascio della concessione edilizia, relativa al progetto, e dovranno essere portati a termine entro trentasei mesi dalla data odierna, salvo eventuale proroga richiesta dalla società e concessa dal Consorzio, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 1984 numero 1";
- **Accertato** che il termine di fine lavori per la realizzazione dello stabilimento di che trattasi era previsto, per il quattordici (14) aprile 2013;
- **Dato** che l'articolo numero 23 comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1984 numero 1 dispone che gli atti di vendita dei terreni devono prevedere termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori per la realizzazione dello stabilimento e tali termini potranno essere prorogati una sola volta e per non più di diciotto (18) mesi con atto motivato, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati;
- **Visto** il verbale di sopralluogo del 14 ottobre 2014 redatto dagli uffici consortili dal quale si evince che i lavori di realizzazione dello stabilimento sono concretamente iniziati;
- **Visto** il cronoprogramma dei lavori, presentato dalla ditta dal quale risulta che i lavori di realizzazione dello stabilimento saranno portati a termine entro il mese di marzo 2015;

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299





Ufficio periferico di Trapani

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ente Pubblico non Economico

L.R. 8/2012

- **Preso** atto del cronoprogramma presentato dalla ditta e ritenuto di concedere la proroga una proroga di diciotto mesi decorrenti dal 14 ottobre 2013 per il completamento dello stabilimento industriale da realizzare sull'area costituita dal lotto numero 38/B, sito all'interno dell'agglomerato est dell'A.S.I. di Trapani;
- **Vista** la comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 84 comma 2 del D. Lgs. n. 159/2001 in data 03/11/2014 (prot. 54423) con la quale la Prefettura di Trapani ha attestato che nei confronti della società "I.M.C. S.p.A." e delle persone sottoposte a verifica ***"non sussistono agli atti d'ufficio cause di divieto sospensione o decadenza previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159"***;

Tutto ciò premesso:

si ritiene, che possa essere concessa la proroga richiesta dalla ditta "I.M.C. S.p.A." in data 24 settembre 2014, assunta al protocollo consortile con il n. 3461/2014.

Trapani 12/11/2014



L'Istruttore Direttivo
(Francesco Scarcella)

Via Libica, 37
91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Fax. 09233296299

REGIONE
SICILIANA

